


| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécess | Noms ressources | Tri 4, 2023 OctNovDéc | Tri 1, 2024 JanFévMar | Tri 2, 2024 AvrMai | Tri 3, 2024 Jui | Tri 4, 2024 JulAoûSep | Tri 1, 2025 OctNovDéc | Tri 2, 2025 JanFévMar | Tri 3, 2025 Avr |
|----|------------|--|------------|--------------|--------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | | Déconstruction anticipée 92 garages | 197 jours? | Jeu 16/11/23 | Ven 16/08/24 | | Déconstruction anticipée 92 garages | | | | | | | | |
| 2 | | Rédaction du programme | 1 mois | Jeu 16/11/23 | Mer 13/12/23 | | Rédaction du programme | | | | | | | | |
| 3 | | Permis de démolir | 2,3 mois | Jeu 14/12/23 | Jeu 15/02/24 | 2 | Permis de démolir | | | | | | | | |
| 4 | | Entreprises & Travaux | 8,85 mois | Jeu 14/12/23 | Ven 16/08/24 | | Entreprise & travaux | | | | | | | | |
| 5 | | DCE | 1,25 mois | Jeu 14/12/23 | Mer 17/01/24 | | DCE | | | | | | | | |
| 6 | | Publication | 1,3 mois | Ven 26/01/24 | Ven 01/03/24 | 5 | Publication | | | | | | | | |
| 7 | | Notification | 1 mois | Lun 04/03/24 | Ven 29/03/24 | 6 | Notification | | | | | | | | |
| 8 | | Diagnostic PEMD | 1,5 mois | Lun 01/04/24 | Ven 10/05/24 | 7 | Diagnostic PEMD | | | | | | | | |
| 9 | | Installation de chantier | 15 jours | Lun 13/05/24 | Ven 31/05/24 | 8 | Preparation de chantier | | | | | | | | |
| 10 | | Démolition évacuation | 2 mois | Lun 03/06/24 | Ven 26/07/24 | 9 | Démolition évacuation | | | | | | | | |
| 11 | | Fin de travaux nettoyage repliement | 15 jours | Lun 29/07/24 | Ven 16/08/24 | 10 | Fin de travaux nettoyage repliement | | | | | | | | |
| 12 | | Recéption démolition livraison plate forme | 1 jour | Lun 19/08/24 | Lun 19/08/24 | 11 | Recéption démolition livraison plate forme | | | | | | | | |

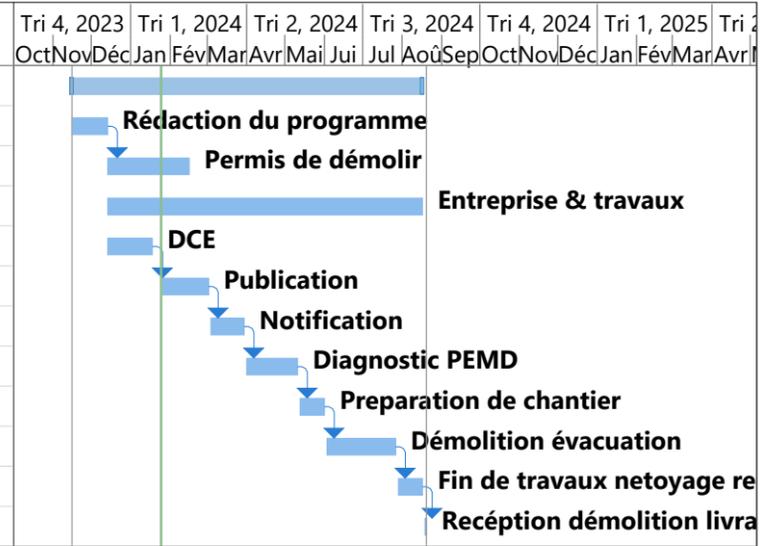

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|----------------------|--|
| Projet : Planning programme d Date : Jeu 25/01/24 | Tâche | | Récapitulatif du projet | | Tâche manuelle | | Début uniquement | | Échéance | |
| | Fractionnement | | Tâche inactive | | Durée uniquement | | Fin uniquement | | Avancement | |
| | Jalon | | Jalon inactif | | Report récapitulatif manuel | | Tâches externes | | Progression manuelle | |
| | Récapitulative | | Récapitulatif inactif | | Récapitulatif manuel | | Jalons externes | | | |
